




# Good Morning Nei Avenue



**Octobre 2018:**  
**DÉBUT DES TRAVAUX DU TRONÇON B**  
**Première phase:**  
**Travaux préparatoires et de déviation des réseaux**

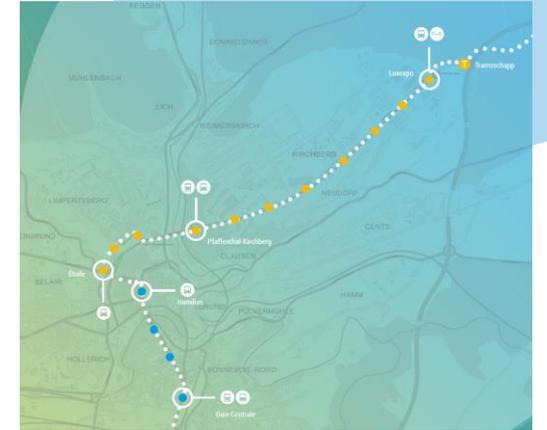

**Avenue Emile Reuter:**  
entre la Place de l'Etoile et le Boulevard Royal



**Avenue de la Liberté:**  
Place de Metz et la Place de Paris

# Travaux réseaux: Av. de la Liberté: Place de Paris – Rue de Strasbourg

## Début des travaux:

13 mai 2019

## Etape 1 : Côté pair

### Nature des Travaux :

renforcement et renouvellement  
des réseaux souterrains:


- eaux (eau potable,  
eau usée, eau pluviale)
- gaz,
- chauffage urbain,
- électricité,
- fibre optique.

### Durée des travaux:

5 mois

### Circulation:

sur 2 voies

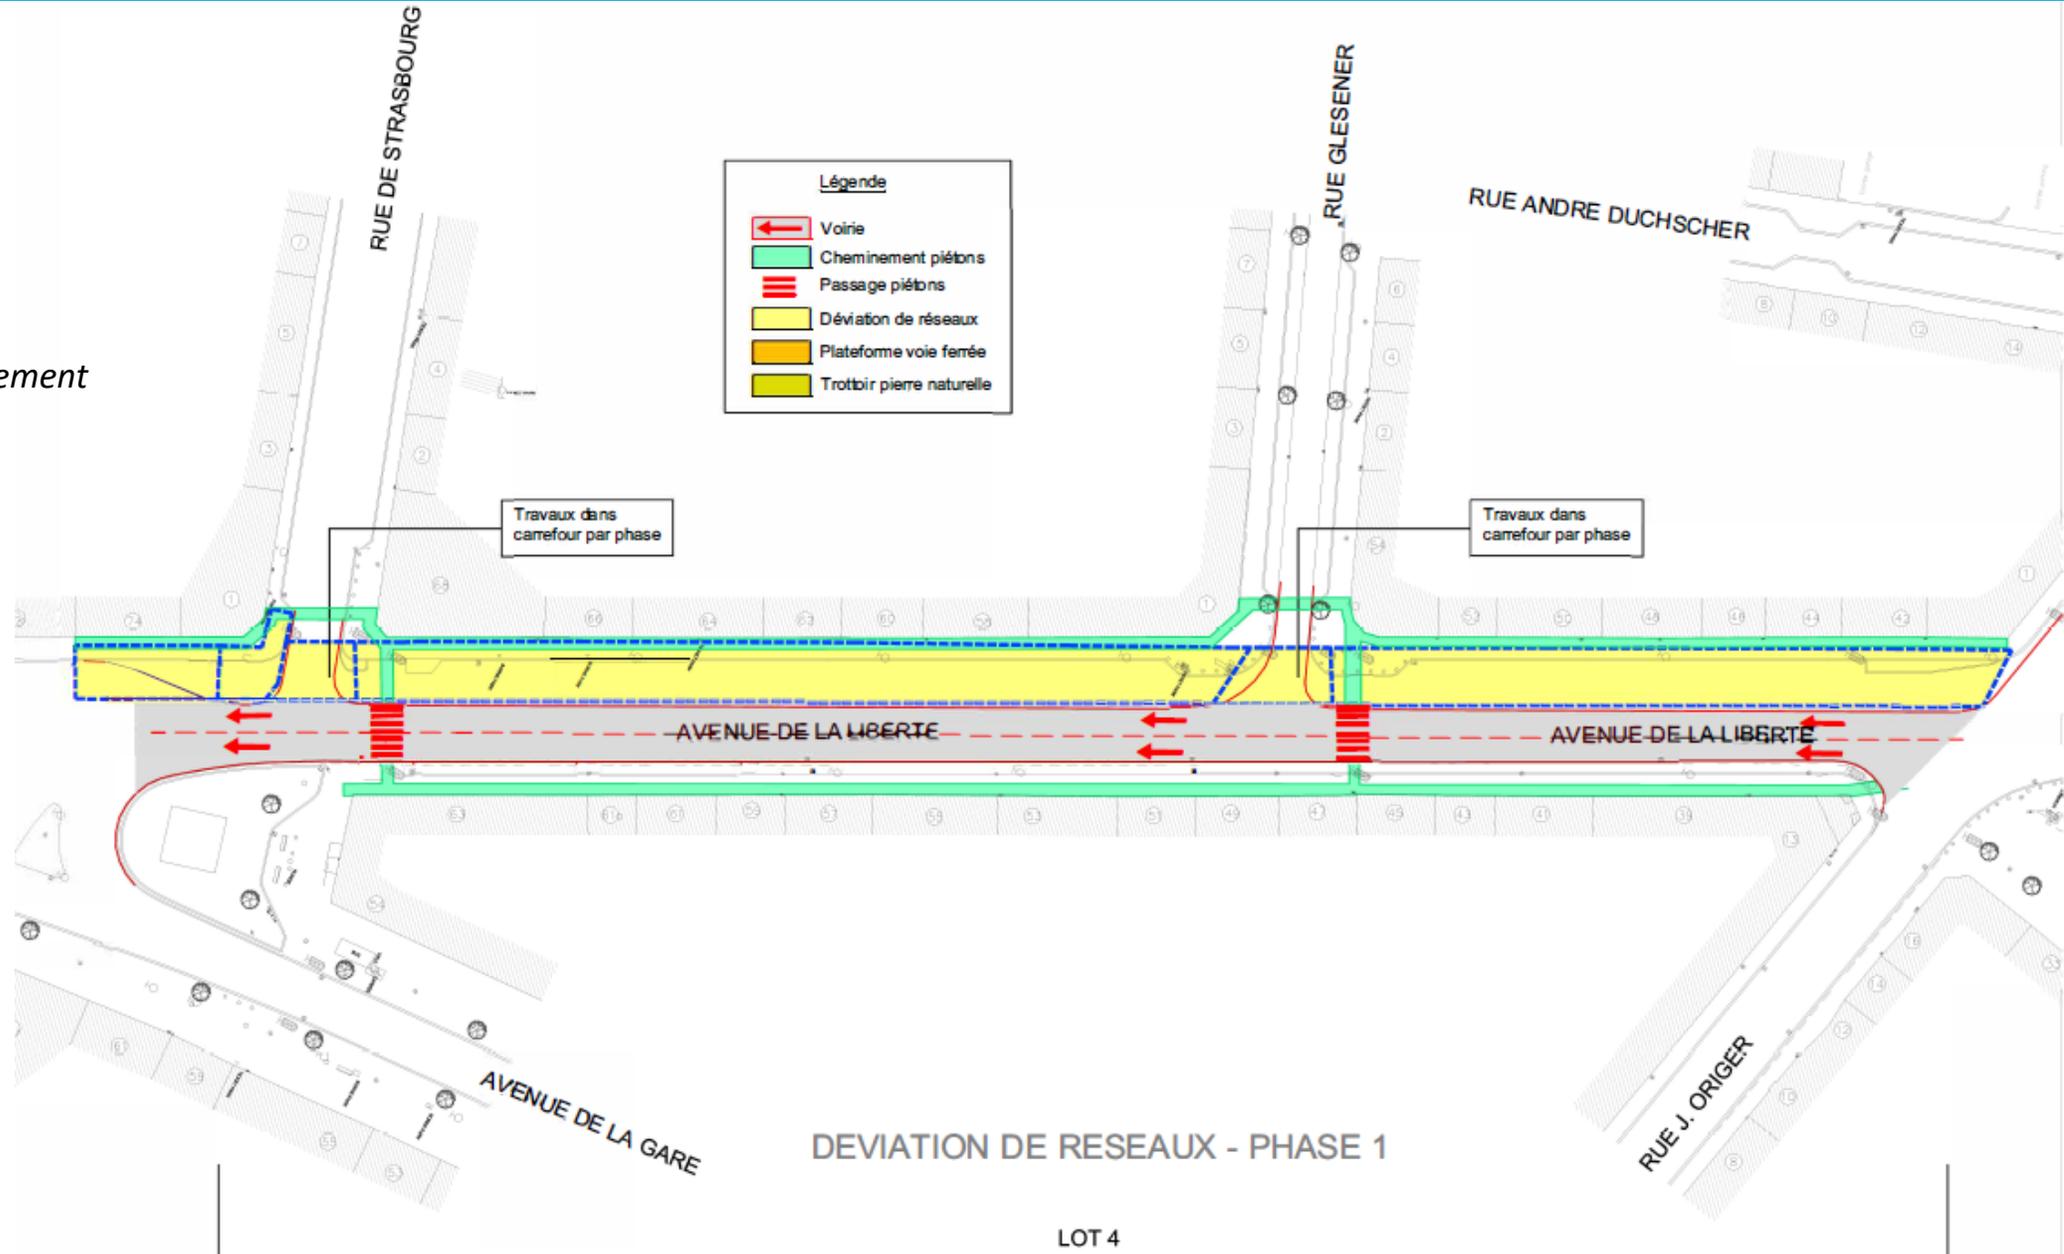

# Travaux réseaux: Av. de la Liberté: Place de Paris – Rue de Strasbourg

## Etape 2 : Côté impair

### Nature des Travaux :

renforcement et renouvellement  
des réseaux souterrains:


- eaux (eau potable,  
eau usée, eau pluviale)
- gaz,
- chauffage urbain,
- électricité,
- fibre optique.

### Durée des travaux:

4 mois

### Circulation:

sur 2 voies

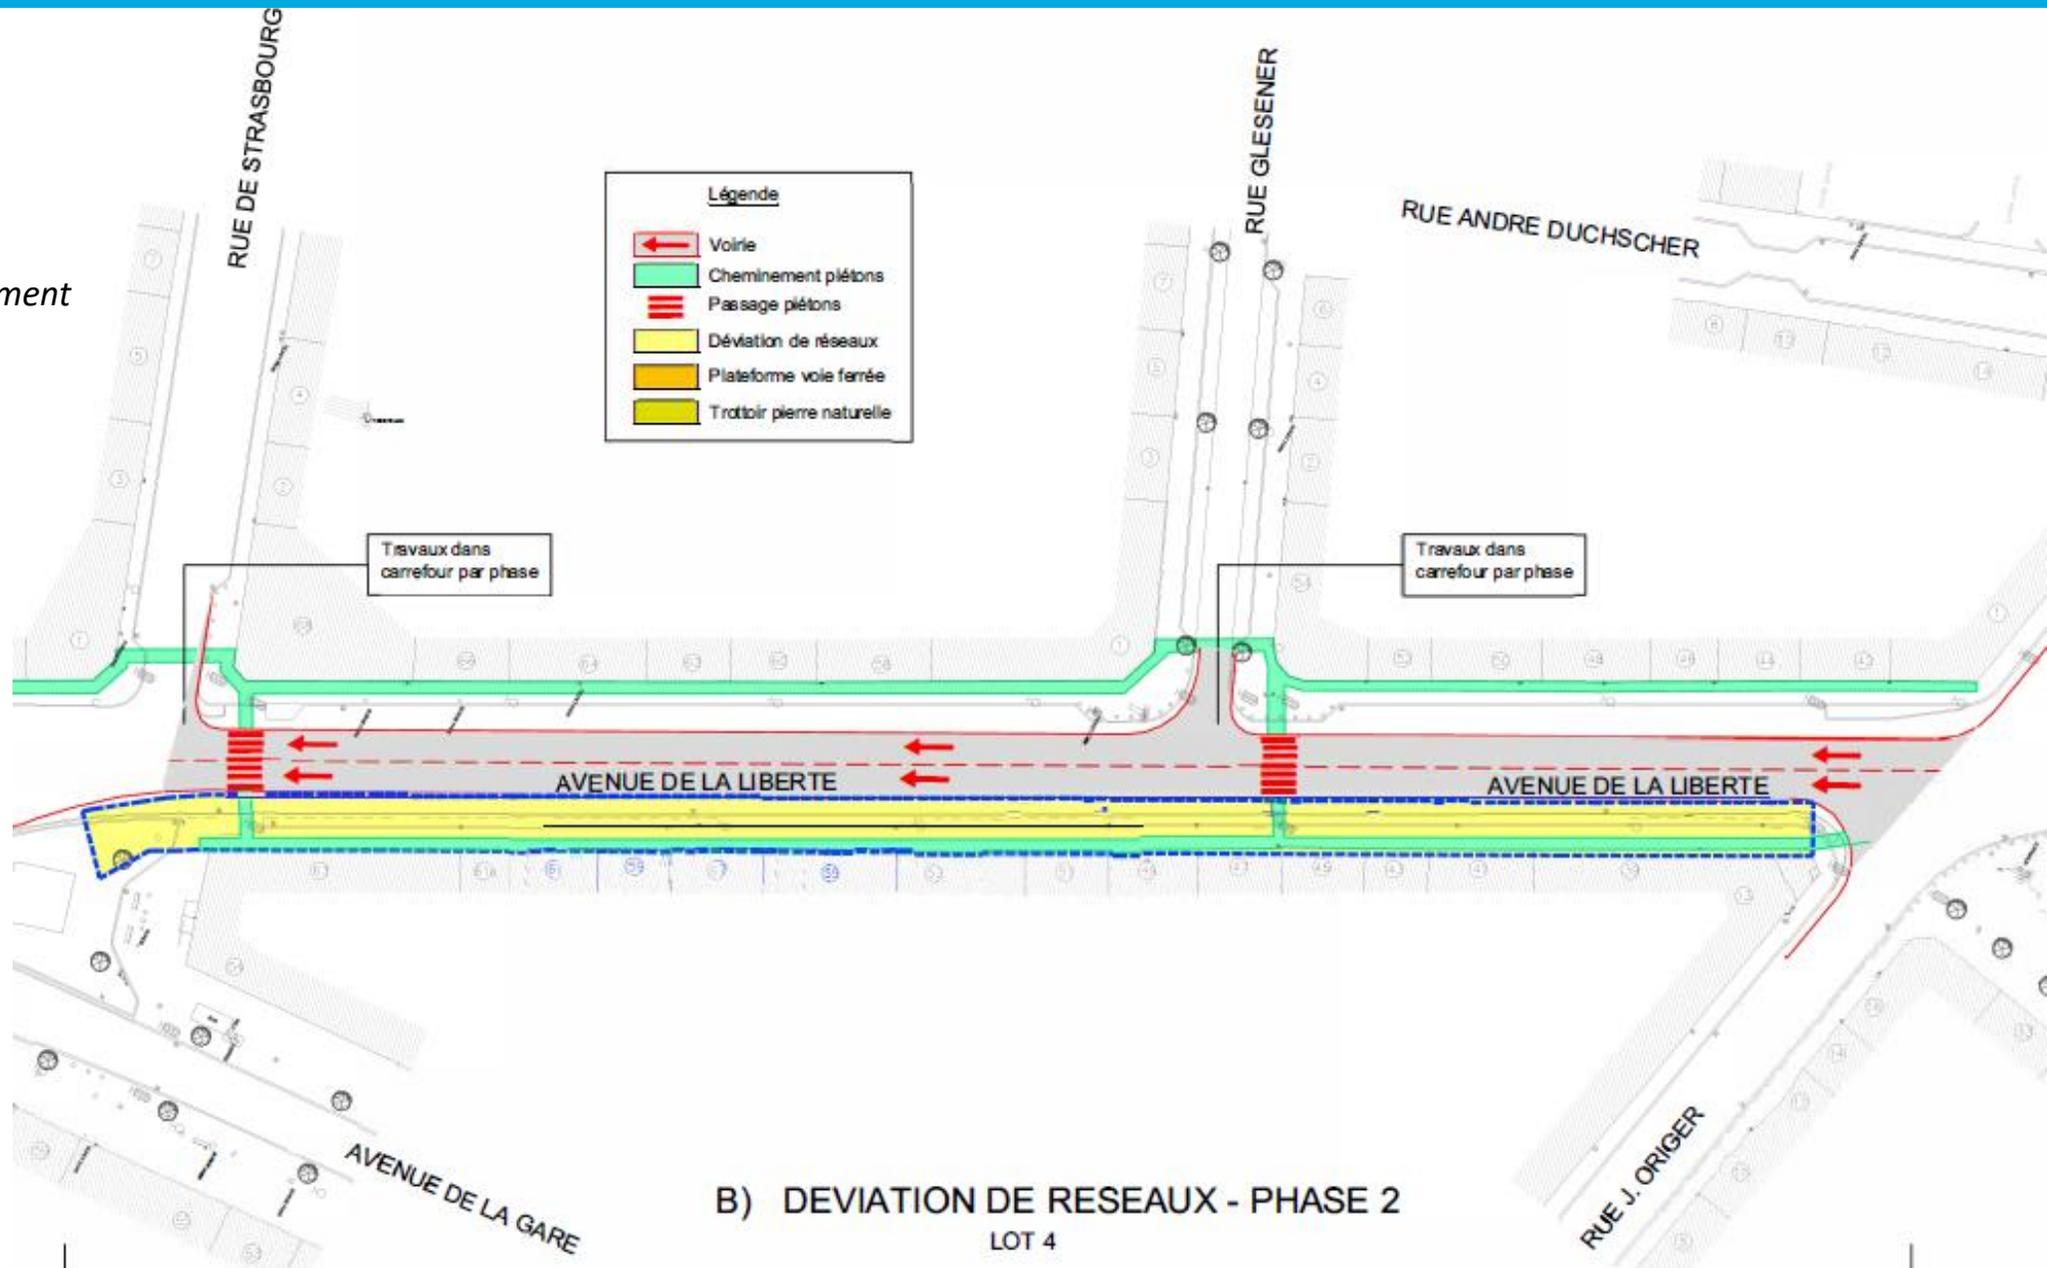

# Travaux Voirie: Av. de la Liberté: Place de Paris – Rue de Strasbourg

**Début des travaux:**  
*début 2020*


**Etape 1: côté pair**

**Nature des Travaux :**

- Structure de la chaussée
- Pose d'un enrobé provisoire

**Durée des travaux:**  
*3 mois*

**Circulation**  
*sur 2 voies*

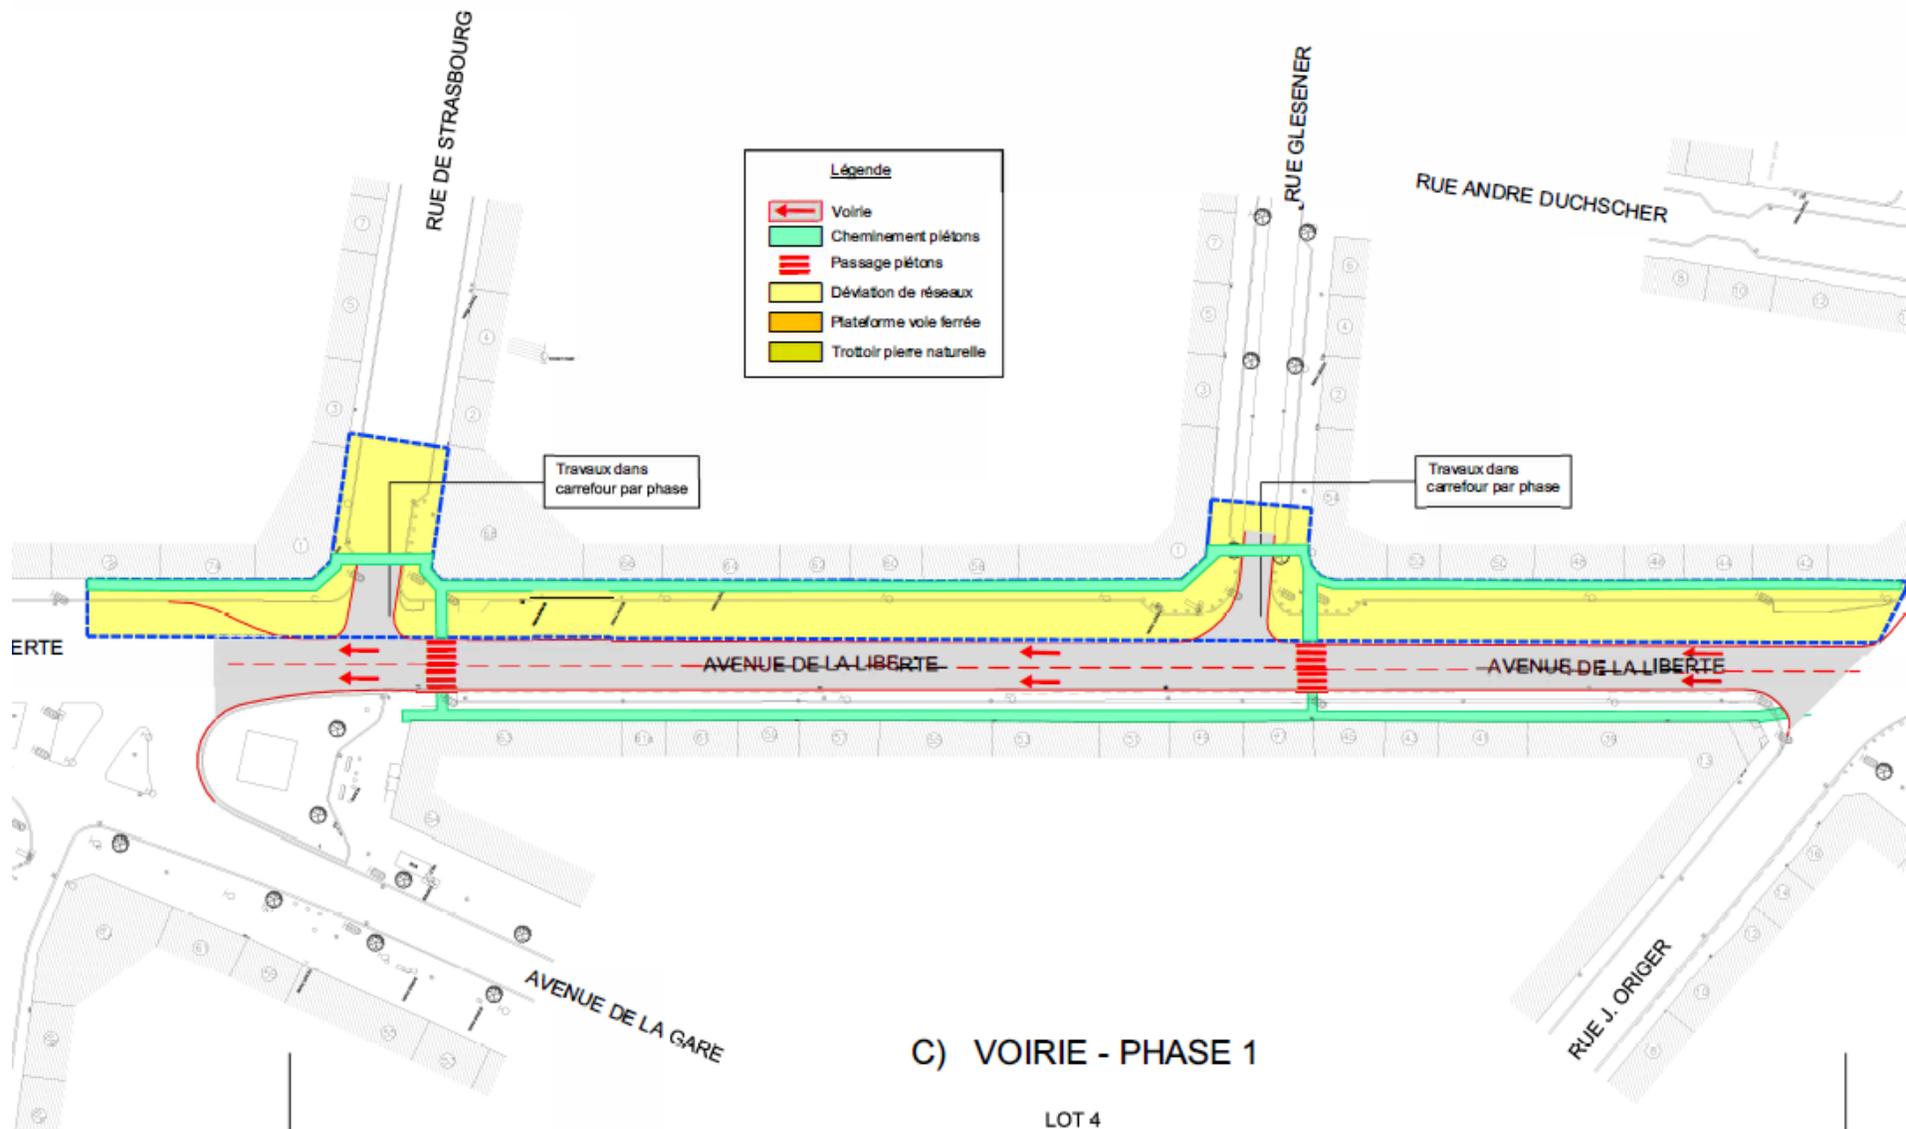

# Travaux Plateforme: Av. de la Liberté: Place de Paris – Rue de Strasbourg

**Début des travaux:**  
*début 2020*


**Etape: Côté impair**

**Nature des Travaux:**

- Pose de fourreaux de multitubulaires tram
- Pose du matelas antivibratile
- Pose des traverses et des rails

**Durée:**  
*5 mois*

**Circulation:**  
*sur 1 voie*

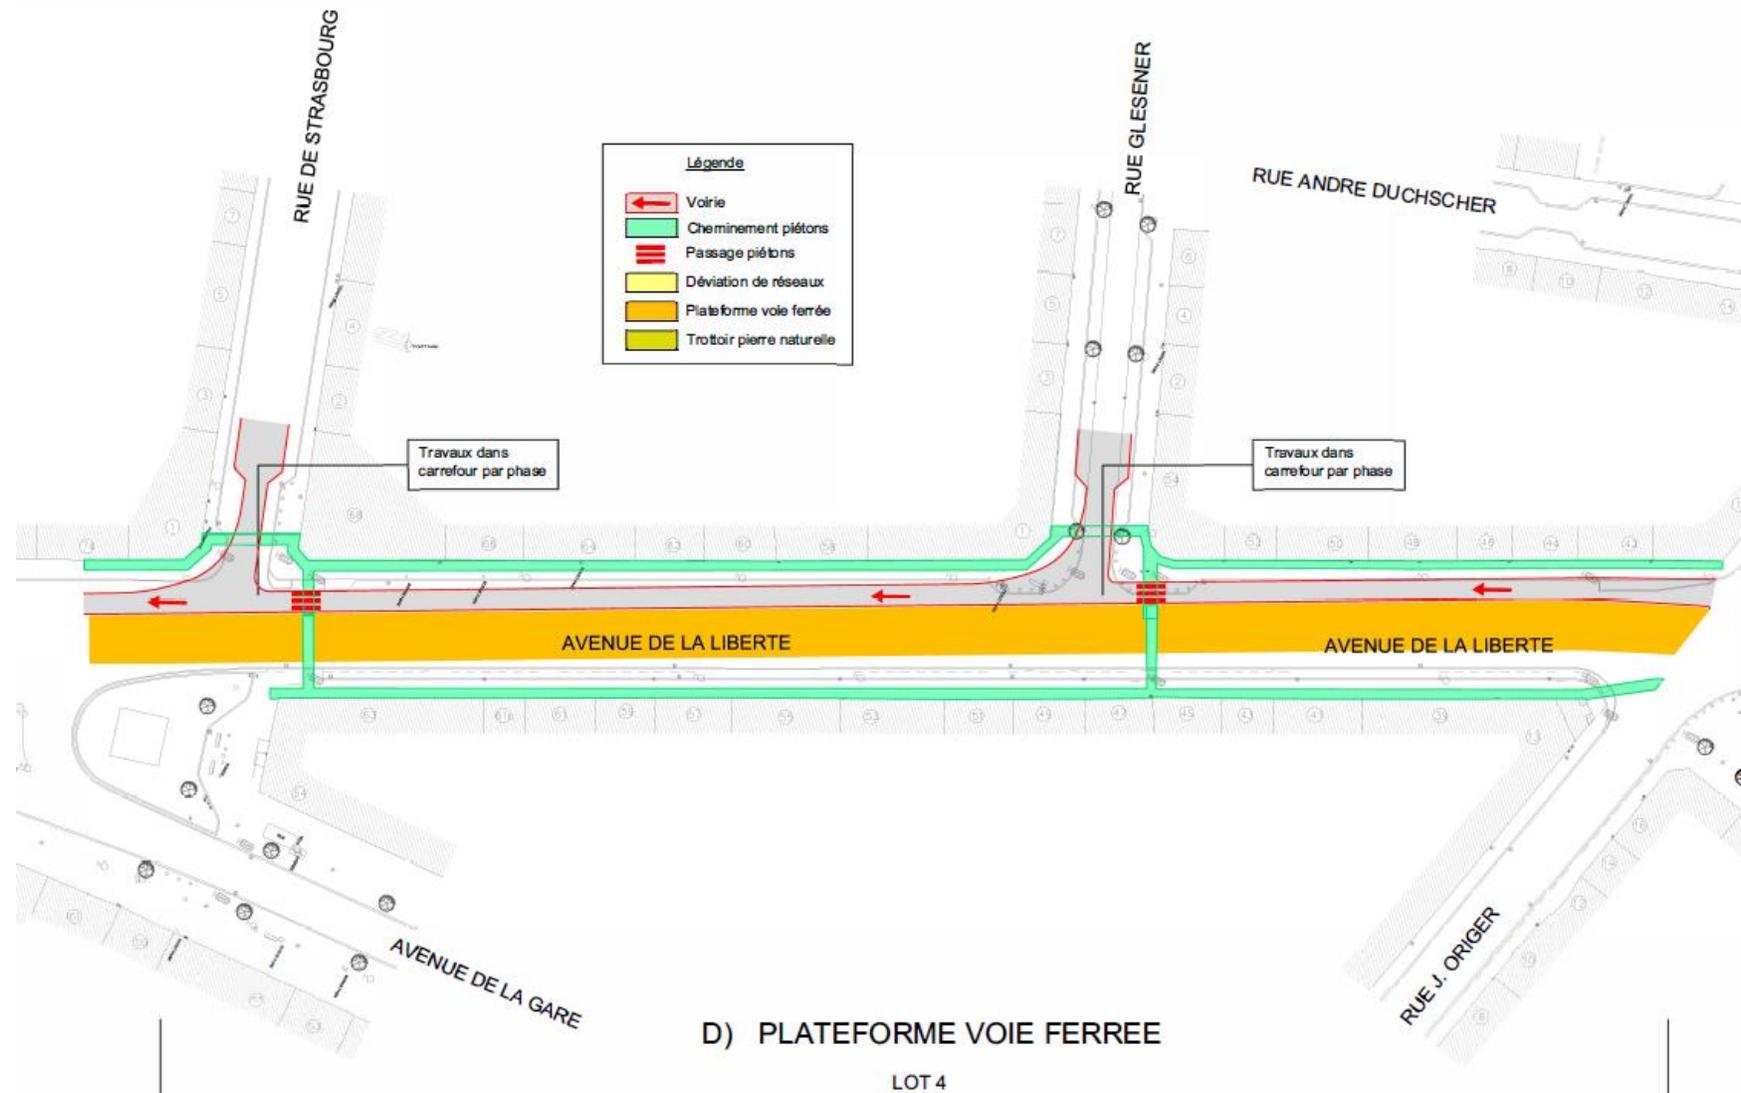

# Travaux Voirie: Av. de la Liberté: Place de Paris – Rue de Strasbourg

## Début des Travaux:

Automne 2020

## Etape 2: De façade à façade

### Nature des travaux:


- Mise en oeuvre du béton désactivé
- Mise en place du mobilier urbain
- Pose des pierres naturelles
- Pose de la dernière couche d'enrobé

### Durée:


5 mois

### Circulation:


sur 1 voie

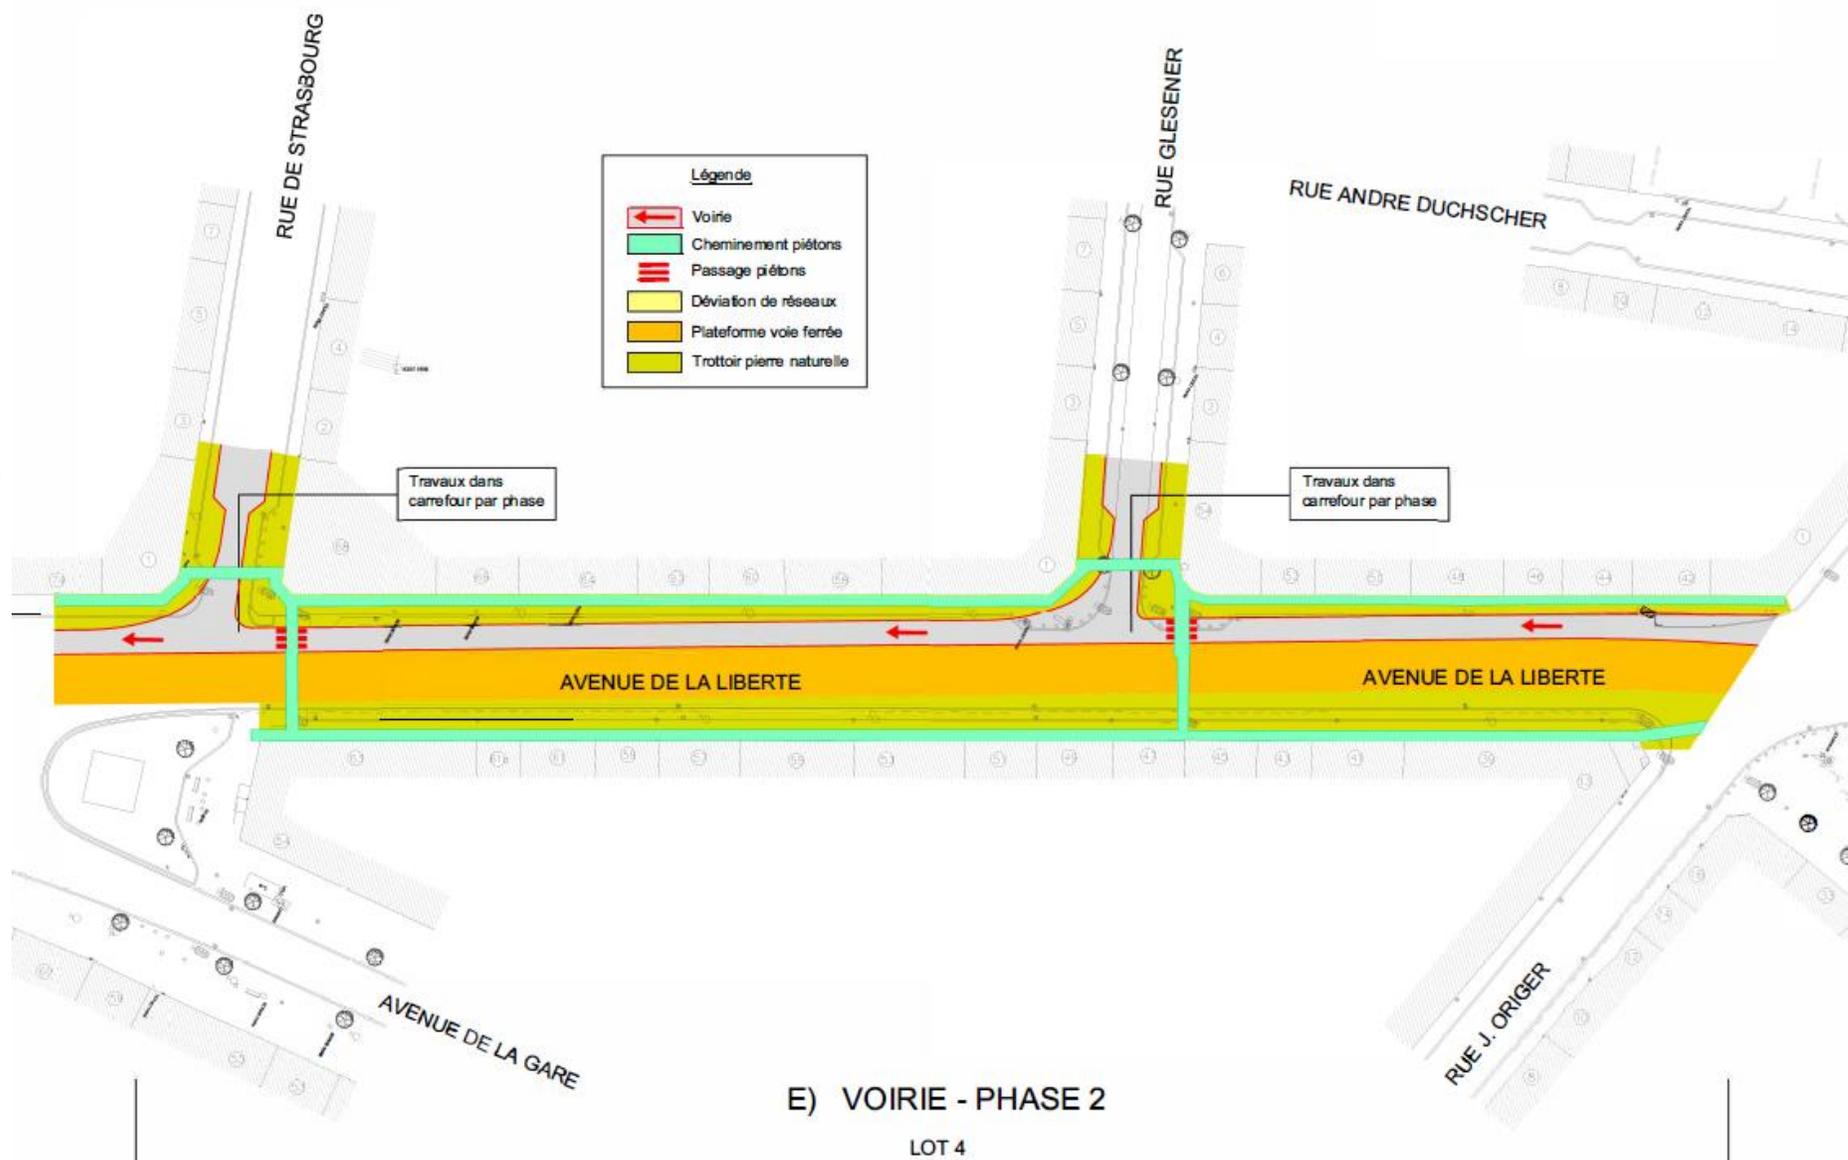

# Sur le site Internet: rubrique dédiée aux travaux

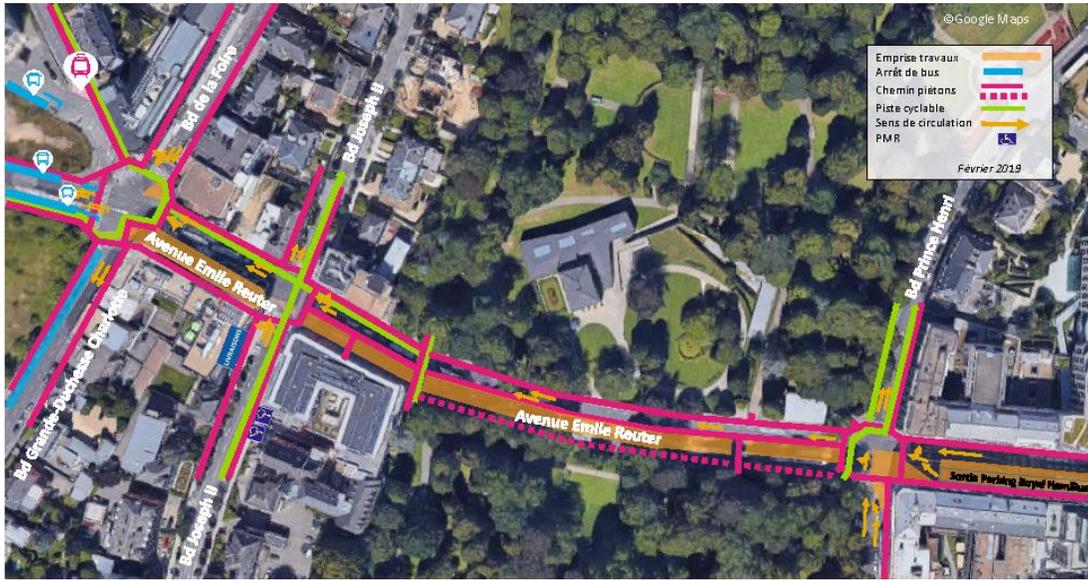

Mise à jour hebdomadaire des plans des travaux de construction du tram

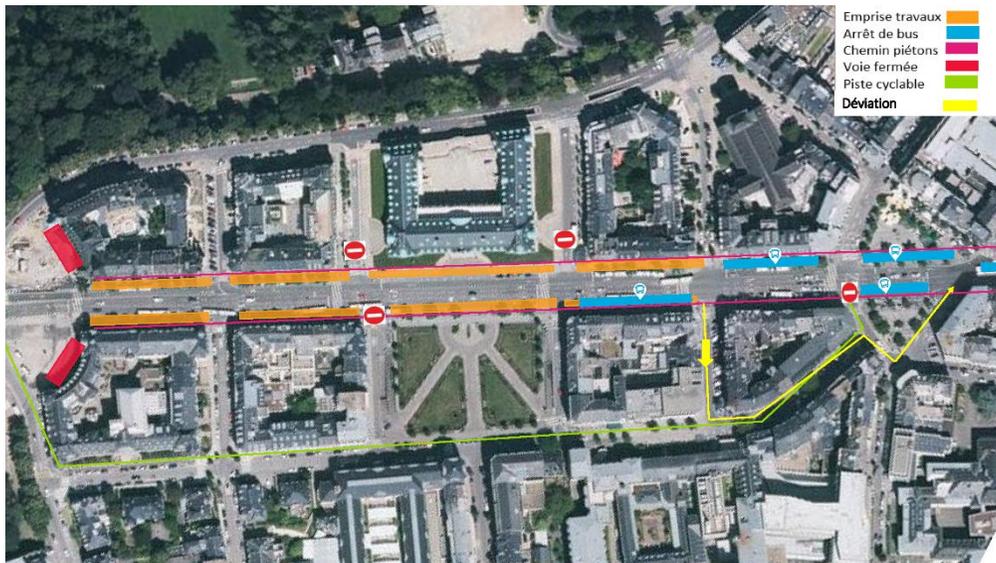

- Emprise travaux
- Arrêt de bus
- Chemin piétons
- Voie fermée
- Piste cyclable
- Déviation

# Une équipe de deux médiateurs de chantier

Une équipe de deux médiateurs de chantier:

**Alex BRAGANCA**

Médiateur de chantier

**Mobile:** 621 779 370

**Email:** [alexandre.bragancadasilva@luxtram.lu](mailto:alexandre.bragancadasilva@luxtram.lu)

**Laure MULLER**

Médiatrice de chantier

**Mobile:** 621 779 366

**Email:** [laure.muller@luxtram.lu](mailto:laure.muller@luxtram.lu)

Heures d'ouvertures:

Lundi : de 11h00 à 14h00

Mercredi: de 14h00 à 17h00

Vendredi: de 11h00 à 14h00



**Localisation:** Boulevard Roosevelt, n°1 (en face du Casino)

